

3.1.2025

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 01/2025

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs loput IV-asennukset

Tulevat työvaiheet:

- Liikuntasalin viimeistelytyöt
- IV-säädöt ja mittaukset

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Aulan portaiden puurakenteet
- Teknisten tilojen sähkötyöt
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Tulevat työvaiheet:

- IV-säädöt ja mittaukset

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
- 1.-2.krs alakattojen ummistus

Tulevat työvaiheet:

- IV-säädöt ja mittaukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs IV-päätelaiteasennukset loppuun

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet (suluissa kokonaisvalmiusprosentti):
 - Lukitus- ja heloitusasennukset (90 %)
 - Varusteasennukset (96 %)
 - Välioviasennukset (96 %)
 - Alakattotyöt ja seinäverhoilut (88 %)
 - Toimintakoesiivoukset (~90 %)
 - Kaluste- ja laiteasennukset (~90 %)
 - Maalauksen korjauskierrokset (~75 %)
 - IV-päätelaiteasennukset (~85 %)
 - Sähkö- ja putkitöiden mittaukset (~95 %)
 - Kaideasennukset (~95 %)
 - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset (~80 %)
- Koulunmäenkatu avataan muulle liikenteelle helmikuun 2025 aikana.

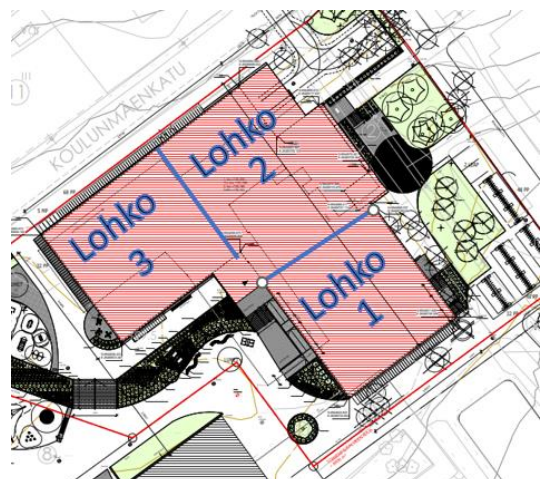

Lohko 3. 3.1.2025

Käytävän viimeiset yläpölyn siivoukset käynnissä ennen alakaton ummistamista.



Lohko 1. 3.1.2025

Liikuntasali. Seinävarusteiden ja ovirakenteiden viimeistelyt käytiin ensi viikosta alkaen.



Lohko 2. 3.1.2025

Aulan liuskan lasikaideasennukset odottavat käsijohdettua. Muiden töiden ohessa aulan nurkkalistoitustyöt käynnissä.



Lohko 2. 3.1.2025

Tekniset tilat. Sähkötyöt käynnissä,
seuraavaksi siivoukset IV-
pääteasennuksille.

