

10.1.2025

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 02/2025

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs loput IV-asennukset
- IV-säädöt ja mittaukset
- Loppusiivoukset

Tulevat työvaiheet:

- Liikuntasalin viimeistelytyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Teknisten tilojen sähkötyöt
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 1.-2.krs alakattojen ummistus

Tulevat työvaiheet:

- IV-säädöt ja mittaukset
- Loppusiivoukset

Valmistuneet työvaiheet:

- Aulan portaiden puurakenteet
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
- 1.-2.krs alakattojen ummistus

Tulevat työvaiheet:

- IV-säädöt ja mittaukset
- Loppusiivoukset

Valmistuneet työvaiheet:

-

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet (suluissa kokonaisvalmiusprosentti):
 - Lukitus- ja heloitusasennukset (92 %)
 - Varusteasennukset (96 %)
 - Välioviasennukset (98 %)
 - Alakattotyöt ja seinäverhoilut (90 %)
 - Toimintakoesiivoukset (80 %)
 - Loppusiivoukset (33 %)
 - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset (83 %)
 - Kaluste- ja laiteasennukset (~90 %)
 - Maalauksen korjauskierrokset (~85 %)
 - IV-päätelaiteasennukset (~90 %)
 - IV säädöt ja mittaukset (~10 %)
 - Sähkö- ja putkitöiden mittaukset (~96 %)
 - Kaideasennukset (~95 %)
- Koulunmäenkatu avataan muulle liikenteelle helmikuun 2025 aikana.

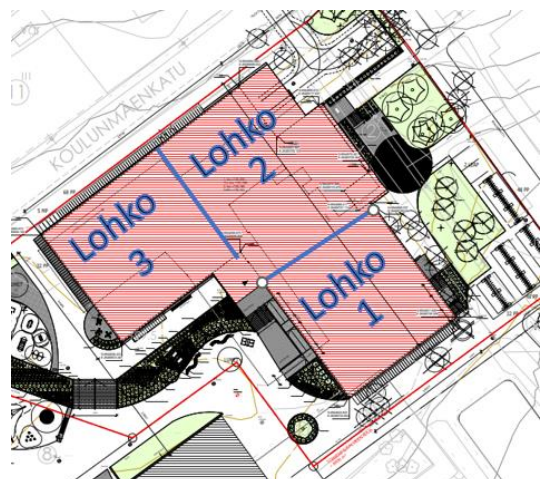

Lohko 1. 10.1.2025

Loppusiivous käynnissä.



Lohko 2. 10.1.2025

Porraskorjaukset käynnissä.



Lohko 2. 10.1.2025

Kaideasennukset pääosin valmistuneet.
Maalauksen kolhukierros kiertämättä.

