

24.1.2025

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 04/2025

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- IV-säädöt ja mittaukset
- Liikuntasalin viimeistelytyöt

Tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- IV-säädöt ja mittaukset
- Loppusiivoukset
- 1.-2.krs alakattojen ummistus

Tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- Teknisten tilojen sähkötyöt
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- IV-säädöt ja mittaukset
- Loppusiivoukset

Tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
- 1.-2.krs alakattojen ummistus

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-


Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet (suluissa kokonaisvalmiusprosentti):
 - Välioviasennukset (98.6 %)
 - Varusteasennukset (99 %)
 - Kaluste- ja laiteasennukset (98 %)
 - Alakattotyöt ja seinäverhoilut (97 %)
 - Lukitus- ja heloitusasennukset (96 %)
 - Toimintakoesiivoukset (80 %)
 - Sähkö- ja putkitöiden mittaukset (99 %)
 - Kaideasennukset (96 %)
 - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset (99 %)

 - Maalauksen korjauskierrokset (~90 %)
 - Loppusiivoukset (~60 %)
 - IV säädöt ja mittaukset (~75 %)
- Koulunmäenkatu avataan muulle liikenteelle helmi-kuun 2025 aikana.
- Perjantaina 31.01.2025 kohteessa rakennusvalvonnan loppukatselmus.

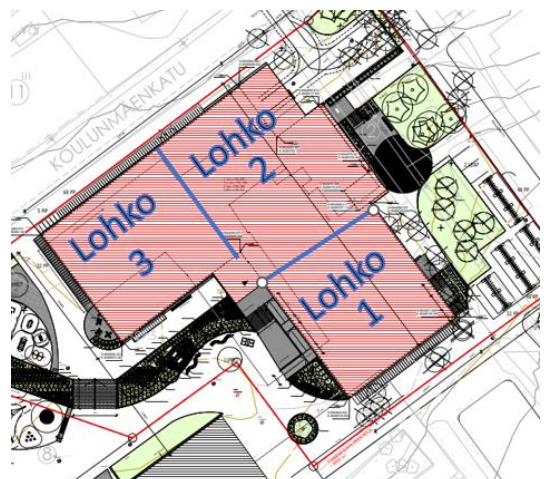

Lohko 3. 24.1.2025

Kirjasto odottaa käyttäjiä.



Lohko 2. 24.1.2025

Musiikkitilojen alakatto ummistettu. IV-mittaukset käynnissä. Loppusiivous seuraa perästä.

