

8.3.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 10/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Liikuntasalin ripustusrakenteet
- Talotekniikkareikien poraukset
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 2.krs kevyet väliseinät
- 2.krs tasoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs sementtiliimojen poistot
- 2.krs IV-asennukset (hormit)

Valmistuneet työvaiheet:

- Ullakon IV-asennukset ja eristykset

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Vesikaton puutyöt
- Vesikaton höyrinsulku
- IVKH tasoitustyöt
- 1.krs lattiasementtiliimojen poistot
- 2.krs kevyet väliseinät
- 3.krs pintalaattojen hionta

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs alapohjan valu (3/3)
- 1.krs alapohjan hionta

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs alapohjan valu (2/3)

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Vesikaton puutyöt
- Talotekniikka reikien poraukset
- Aurinkopaneeliasennukset
- 1.krs kevyet väliseinät
- 3.krs IVKH lattiaraudoitukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- 2.krs pintalaattojen hionta

Valmistuneet työvaiheet:

- Työmaan vesilinjan asennukset
- Vesikaton höyrinsulku
- 2.krs pintalaattojen raudoitustyöt
- 2.krs pintalaattojen valu

### Muuta

- Koulunmäenkatu katkaistu liikenteeltä, kulkureitti jalankulkijoille reunassa

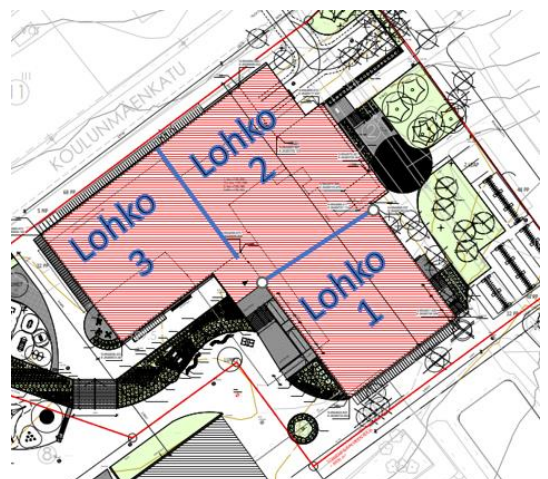

Lohko 1. 8.3.2024

Väestönsuojan tasoitus- ja  
maalaustyöt käynnissä.  
Talotekniikkaurakoitsijat seuraavat  
perästä.



Lohko 3. 1.3.2024

3.krs kevyiden väliseinien  
asennukset menossa. Maalaus- ja  
tasoiteurakoitsija seuraa perästä.



Lohko 2. 1.3.2024

IV-konehuoneen tasoitustyöt  
aloitettu.



Lohko 2-3. 1.3.2024

Vesikaton puurakenteet ja  
höyrynsulkuasennukset  
meneillään.

