

23.8.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 34/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Tasoitus- ja maalaustyöt (liikuntasali)
- 1.-2.krs kaluste- ja laiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Näyttämön asennus (liikuntasali)
- Salivarusteiden asennus (liikuntasali)
- Säteilijöiden asennus (liikuntasali)
- 1.-2.krs varusteasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH putkityöt
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.krs tasoi- ja maalaustyöt
- 1.krs alakattotyöt
- 2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

Valmistuneet työvaiheet:

- Hissin asennus
- Raitisilmakammion eristystyöt
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 2.krs vinyylilankkuasennukset
- 2.krs kalusteasennukset
- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt
- 1.-2.krs alakattotyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs varusteasennukset

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs IV-asennukset
- 1.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt
- 1.krs ikkunapellitykset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

- Julkisivun puu- ja levytyöt
- Sisäntulokatoksien puurakenteet
- Sisäntulokatoksien peltirakenteet

Muuta

- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) asennukset vk 35–36
- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) luokituksen ja heloitukset asennukset vk 35
- Koulunmäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankuluväylä kulkee Koulunmäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

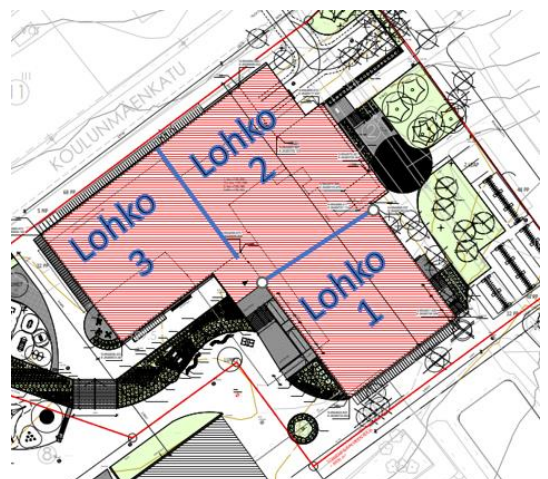

Piha. 23.8.2024

Pihan portaiden asennukset etenevät tukimuuriasennuksien perästä. Julkisivu paikattu telineistä tulleista rei'istä.



Piha. 23.8.2024

IV-konehuoneesta ylimääräisen
tavaran nostot käynnissä.
Metallilasiseinien asennukset
tehty. Oviasennukset perään.



Lohko 1. 23.8.2024

Liikuntasalin tasoite- ja maalaustyöt valmistumassa ensi viikon alkuun. Näyttämön ja salivarusteiden asennukset perään.



Lohko 3. 2.8.2024

2.krs lattiamateriaali (vinyylilankku),
kalusteet, laatoitukset ja
alakattorungot pääosin huoneissa
asennettuna.

