

30.8.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 35/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Näyttämön asennus (liikuntasali)
- Salivarusteiden asennus (liikuntasali)
- 1.-2.krs kaluste- ja laiteasennukset
- 1.-2.krs varusteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Säteilijöiden asennus (liikuntasali)

Valmistuneet työvaiheet:

- Tasoitus- ja maalaustyöt (liikuntasali)

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH putkityöt
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs alakattotyöt
- 1.-2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Raitisilmakammion eristystyöt (viimeistely)

Valmistuneet työvaiheet:

- 

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 2.krs vinyylilankkuasennukset
- 2.krs kalusteasennukset
- 2.krs varusteasennukset
- 1.-2.krs alakattotyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs vesieristys- ja laatoitustyöt

### Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Aluerakenteet
- 1.krs ikkunapellitykset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Katoslippojen kourut ja syöksyt (viimeistely)
- Piha- ja aluevarustetyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 

### Muuta

- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) asennukset vk 36–37
- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) lukituksen ja heloitukset asennukset siirtyneet oviasennuksen mukaan
- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankuluväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

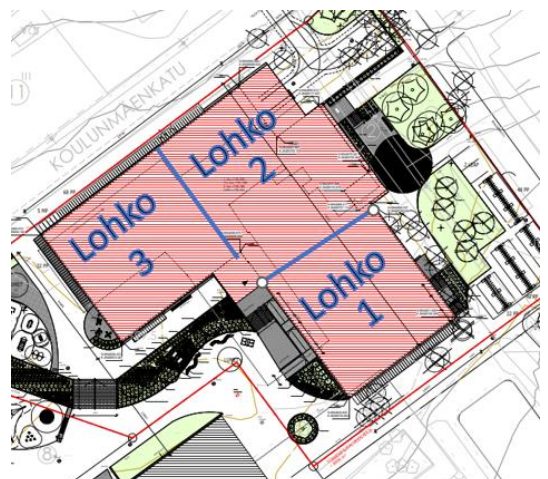

Lohko 3. 30.8.2024

Alakattorunkojen asennukset  
käynnissä. Varusteasennukset ja  
lattiapintamateriaalit seuraavat  
perästä.



Lohko 1. 30.8.2024

Liikuntasalin valkokankaan ja näyttämörakenteiden työt käynnissä. Tiloissa myös liikuntasalivarusteiden asennus käynnissä.



Lohko 2. 30.8.2024

Viimeisiä maalaustöitä tehdään  
1.krs aulassa.



Piha. 30.8.2024

Pääsisäänkäynnin valaistukset ja  
ikkunapellitykset tehty. Lasiseinän  
pellitykset ja oviaasennukset  
seuraavat perästä.

