

6.9.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 36/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Salivarusteiden asennus (liikuntasali)
- 1.-2.krs kaluste- ja laiteasennukset
- 1.-2.krs varusteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Säteilijöiden asennus (liikuntasali)

Valmistuneet työvaiheet:

- Näyttämön asennus (liikuntasali)

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH putkityöt
- Raitisilmakammion eristystyöt (viimeistely)
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.krs mattotyöt
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.krs alakattotyöt
- 1.-2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 2.krs alakattotyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 2.krs vinyylilankkuasennukset
- 2.krs kalusteasennukset
- 1.-2.krs varusteasennukset
- 1.-2.krs alakattotyöt
- 1.krs mattotyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

-

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Katoslippojen kourut ja syöksyt (viimeistely)
- Piha- ja aluevarustetyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs ikkunapellitykset
- Aluerakenteet

Muuta

- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) asennukset → Pääosin asennettu
- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) lukituksen ja heloitukset asennukset siirtyneet oviaasennuksen mukaan → Parhaillaan työt seuraavat perässä
- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.
- Katon aurinkovoimalakenttä valmis.

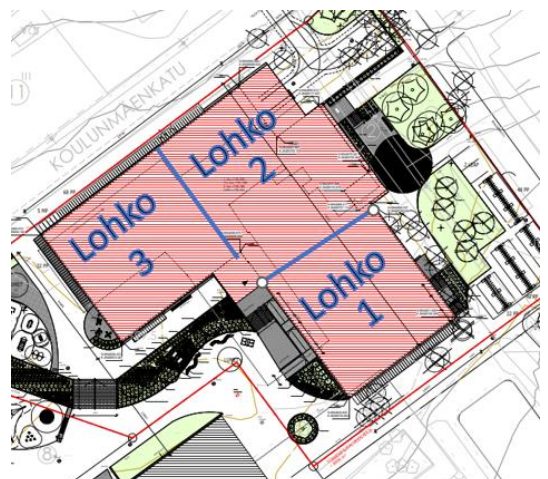

Lohko 2. 5.9.2024

Isot alumiinilasiseinät
asennettuna. Lukitus- ja
heloitukset seuraavat perästä.



Lohko 1. 5.9.2024

Liikuntasalin katsomorakenteet asennettu.
Sähkönsyötöt seuraavat perästä. Tiloissa
myös liikuntasalivarusteiden asennus
käynnissä.



Lohko 2. 6.9.2024

Sisälasi-ikkunat pääosin asennettu toispuoleisesti. Seuraavaksi ikkunoiden puhdistus, akustiikkavillojen asennus ja toisen ikkunan asennus.



Piha. 6.9.2024

Tukimuurielementit ja kiviaskelmat asennettu. Piha- ja aluevaruste-urakka seuraa perästä.

