

13.9.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

## Viikkotiedote vko 37/2024

### Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Salivarusteiden asennus (liikuntasali)
- 1.-2.krs kaluste- ja laiteasennukset
- 1.-2.krs varusteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Säteilijöiden asennus (liikuntasali)
- Hissin pellitystyöt (viimeistelyt) ja käyttöönotto

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs tekstiilimattoasennukset

### Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- IVKH putkityöt
- 1.krs tasoitus- ja maalaustyöt
- 1.-2.krs kuivien tilojen laatoitustyöt
- 1.-2.krs alakattotyöt
- 1.-2.krs IV-asennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 

Valmistuneet työvaiheet:

- Raitisilmakammion eristystyöt (viimeistely)
- 1.krs mattotyöt

### Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- Ullakon IV-asennukset
- 1.krs mattotyöt
- 1.-2.krs vinyylilankkuasennukset
- 1.-2.krs varusteasennukset
- 1.-2.krs alakattotyöt
- 1.-2.krs vinyylilankkuasennukset
- 2.krs kalusteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 

Valmistuneet työvaiheet:

- 

### Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Piha- ja aluevarustetyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


- Katoslippojen kourut ja syöksyt (viimeistely)

Valmistuneet työvaiheet:

- 

### Muuta

- Umpiteräs- ja alumiinilasiovien (ulko-ovet) asennukset → Osa asennetaan viime tingassa
- Lukitus- ja heloitustyöt käynnissä sisällä
- Koulumäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 18.–19.7. Jatkossa jalankulkuväylä kulkee Koulumäenkadun lävitse. Lisäksi vain työmaakäytössä oleva autoliikenneväylä.

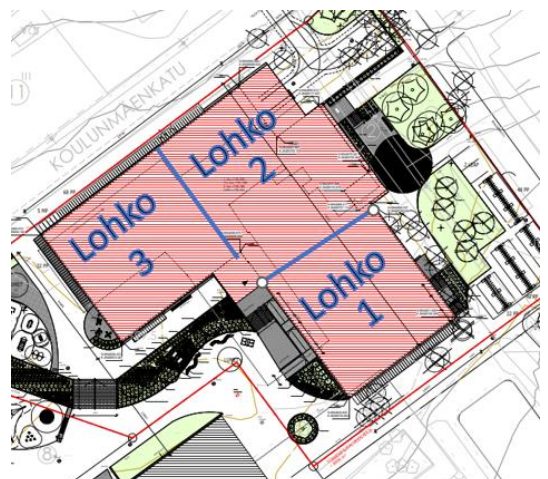

Lohko 3. 13.9.2024

2.krs kalusteet pääosin asennettuna. Kodinkoneiden asennukset aloitettu. Kalusteiden välitilan laatoitukset seuraavat perästä.



Lohko 3. 13.9.2024

Vinyylilankkuasennukset  
siirtyneet alakertaan.  
Kalusteasennukset jatkuvat  
perästä.



Lohko 1. 13.9.2024

Liikuntasalivarusteiden  
asennukset käynnissä. Tilan  
lämpösäteilijöiden asennukset  
alkavat ensi viikolla.



Piha. 13.9.2024

Piha- ja aluevarusteasennukset  
aloitettu reunakivien alustan  
kaivuutöillä.

