

15.11.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 46/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs loput IV-asennukset
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

- Liikuntasalin alakattotyöt (runko)
- 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IVKH putkityöt
- IVKH tekniikkalevyjen asennus
- 1.krs loput IV-asennukset
- 1.krs käytävän laitoitustyöt
- Aulan lasikaideasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Musiikkitilan taiteoven asennus

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet:
 - Lukitus- ja heloitusasennukset
 - Varusteasennukset
 - Kaluste- ja laiteasennukset
 - Välioviasennukset
 - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset
 - Sisä- ja ulkopuolen käsijohdeasennukset
 - Toimintakoesiivoukset ja ikkunoiden pesut
- Koulunmäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 15.11. Työmaa-aluetta pienennetty.

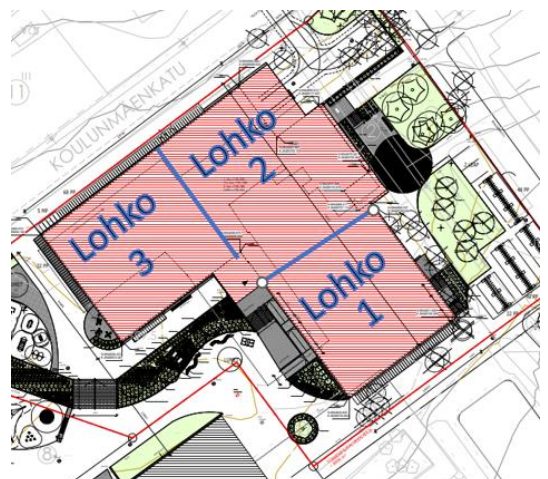

Lohko 2. 15.11.2024

Portaiden laatoitustyöt tehty.
Lasikaideasennukset käynnissä.
Puisten istuinportaiden teko alkaa
ensi viikolla.



Lohko 1. 15.11.2024

Kerros 2, listoitustyöt ja
toimintakoesiivous valmis.



Lohko 2. 15.11.2024

Aulan laatoitustyöt käynnissä.
Alakaton esivalmistelutyöt tehty,
putkiasennukset jatkuvat
laatoitustyön jälkeen.



Lohko 3. 15.11.2024

Ovi- ja ikkunalistatyöt käynnissä.
Osittain IV-päätelaiteasennukset
kesken. Toimintakoesiivous
seuraa perästä.

