

22.11.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 47/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs loput IV-asennukset
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Liikuntasalin alakaton ummistus
- Liikuntasalin joustolattiarakenteet
- 2.krs liukulasiovien asennus

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IVKH putkityöt
- IVKH tekniikkalevyjen asennus
- Aulan lasikaideasennukset
- 1.krs loput IV-asennukset
- 1.krs käytävän laatoitustyöt
- 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Sisäikkunoiden asennus loppuun
- 1.krs aulan väliovien asennus
- 1.krs aulan alakattorunko
- 1.krs teknisten tilojen purunpoistokanava-asennus

Valmistuneet työvaiheet:

-

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

-

Valmistuneet työvaiheet:

-


Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet:
 - Lukitus- ja heloitusasennukset
 - Varusteasennukset
 - Kaluste- ja laiteasennukset
 - Välioviasennukset
 - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset
 - Sisä- ja ulkopuolen kaideasennukset
 - Toimintakoesiivoukset
- Koulunmäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 15.11. Betoniaitoja siirretty.



Lohko 2. 22.11.2024

Puisten istuinportaiden teko käynnissä. Lasikaideasennukset jatkuvat ensi viikolla. 1.krs lattiat laatoitettu.

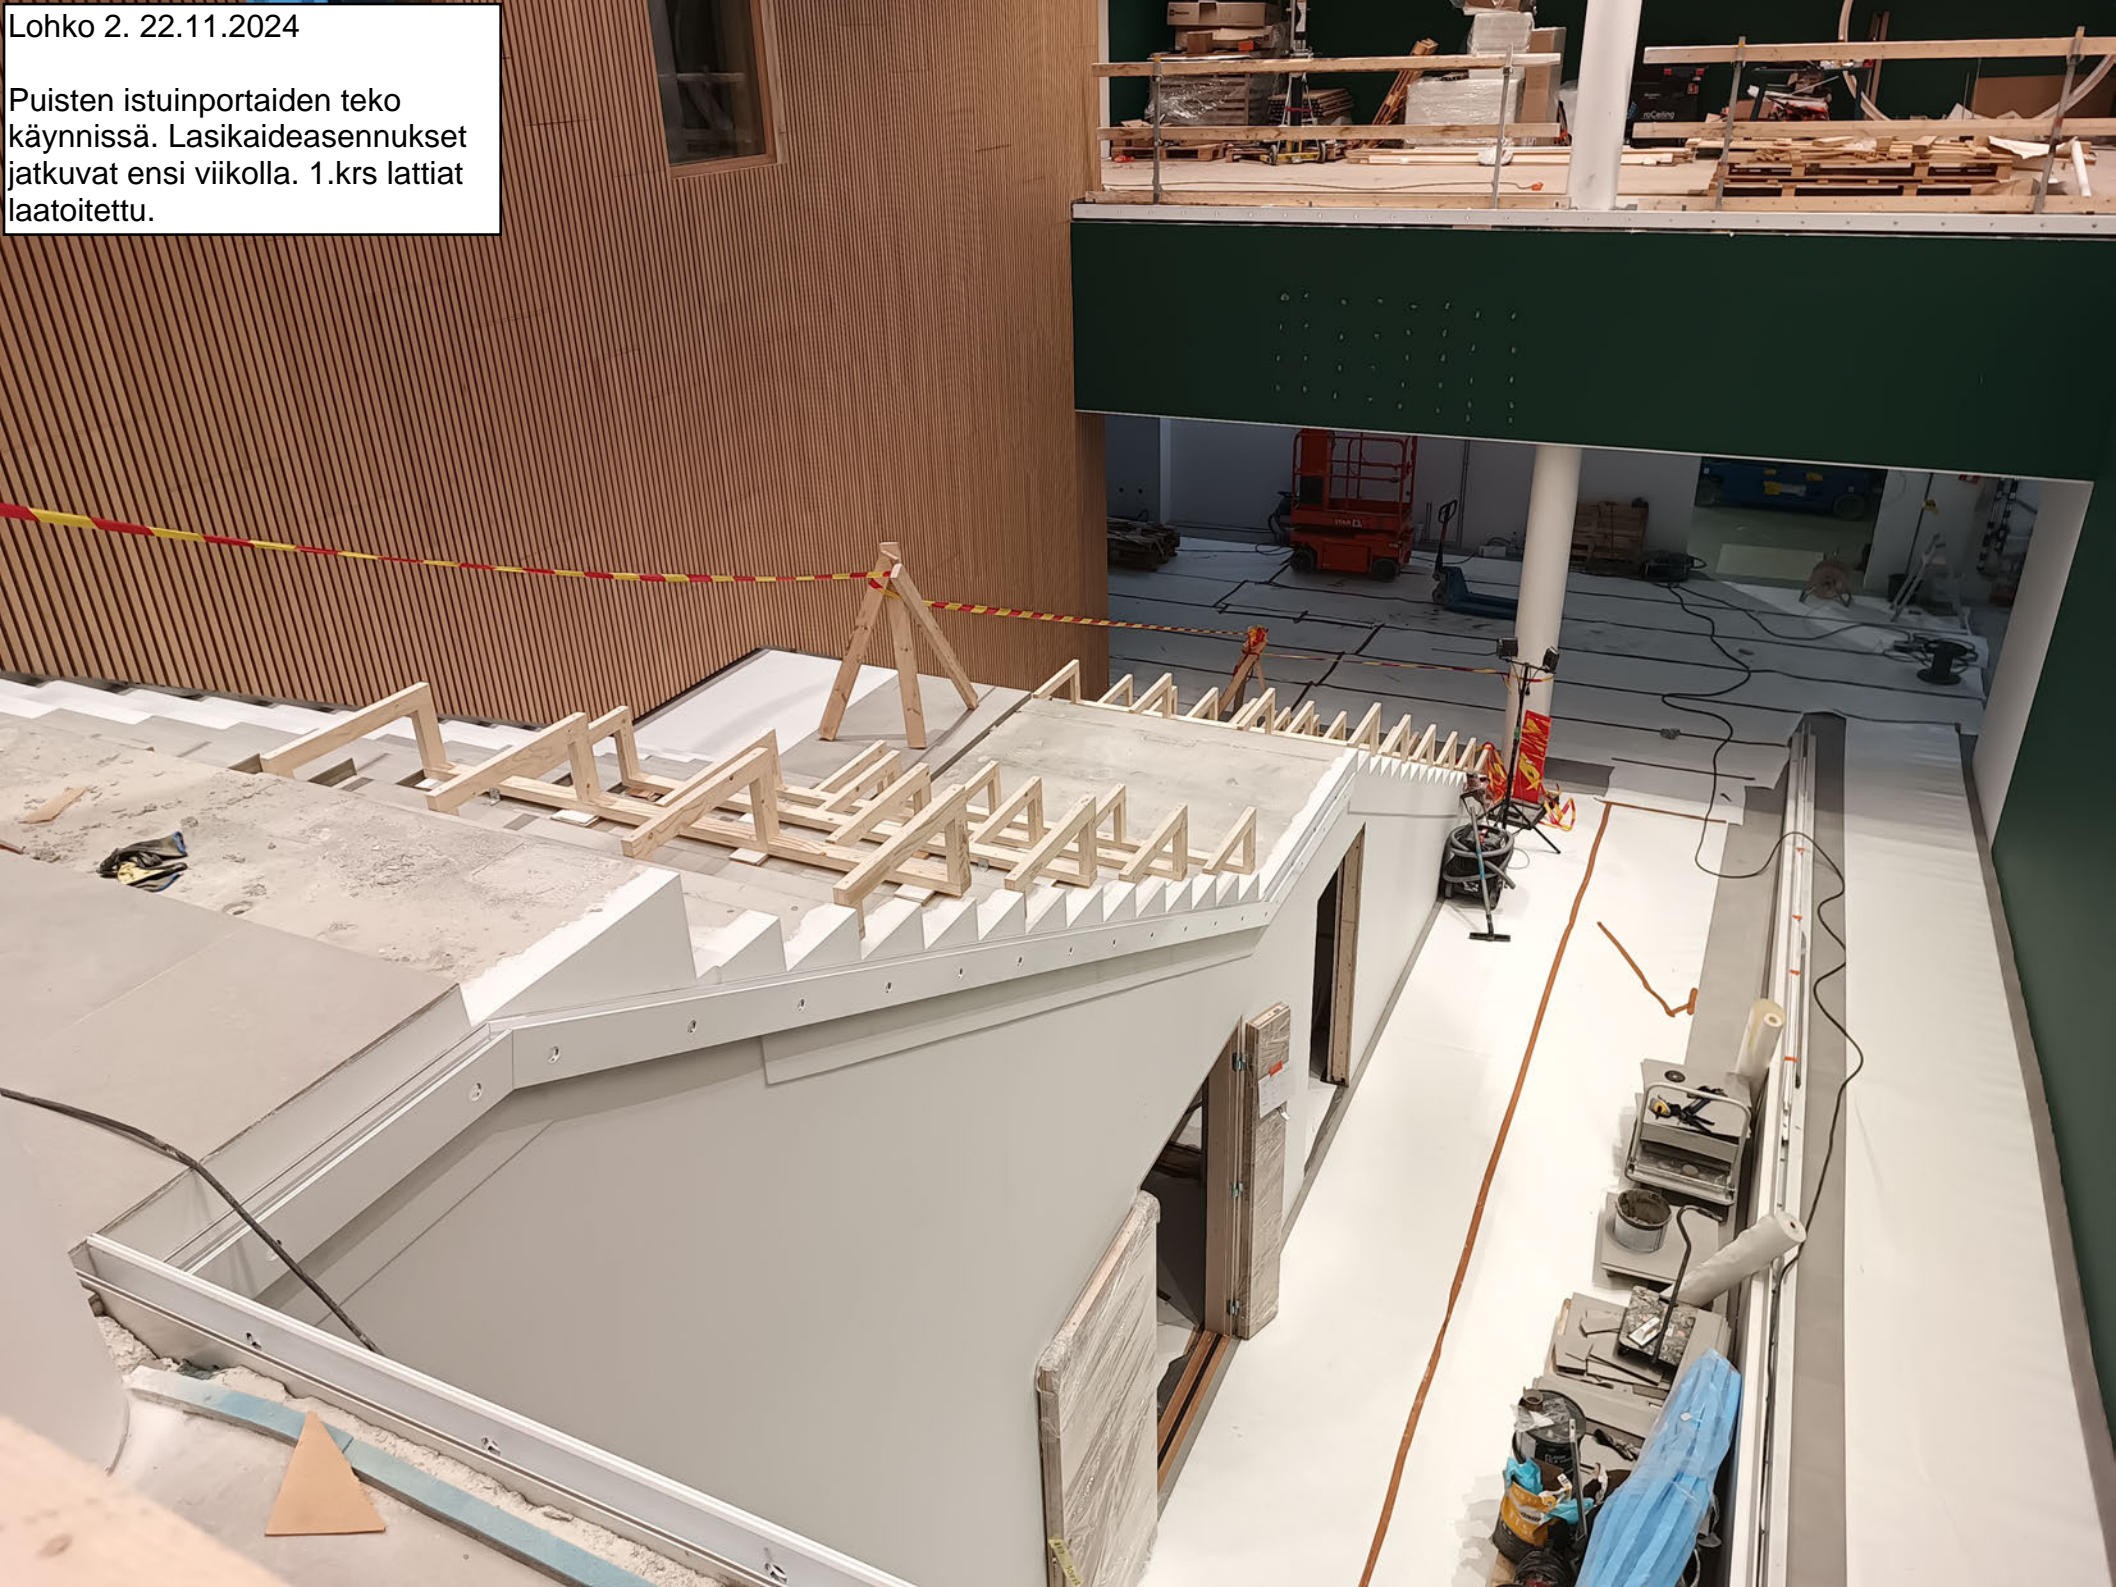

Lohko 1. 22.11.2024

Kerros 2 toimintakoesiivottu. Ensi viikolla viimeiset oviasennukset.



Lohko 1. 22.11.2024

Liikuntasali edistyy. Ensi viikolla viimeiset työt ennen lattiamateriaalin asennusta.



Lohko 2. 22.11.2024

Ovi- ja ikkunalistatyöt käynnissä
2. kerroksessa. IV-
päätelaitteasennukset seuraavat
perästä.

