

29.11.2024

Koulunmäen yhtenäiskoulu, yläkoulu (C-rakennus)

Projekti 318123

Viikkotiedote vko 48/2024

Lohko 1

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs loput IV-asennukset
- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Liikuntasalin joustolattiarakenteet
- 1.krs loput mattotyöt
- 2.krs liukulasiovien asennus

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- Liikuntasalin alakaton ummistus

Lohko 2

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- IVKH putkityöt
- IVKH tekniikkalevyjen asennus
- Aulan lasikaideasennukset
- Aulan portaiden puurakenteet
- 1.krs käytävän laatoitustyöt
- 1.krs aulan väliovien asennus
- 1.krs teknisten tilojen purunpoistokanava-asennus
- 2.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- Sisäikkunoiden asennus loppuun
- 1.krs loput mattotyöt

Valmistuneet työvaiheet:

- 1.krs aulan alakattorunko

Lohko 3

Meneillään olevat työvaiheet:

- Sähkö- ja putkityöt
- 1.krs IV-päätelaiteasennukset
- 2.krs IV-päätelaiteasennukset

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:

- 1.krs ovi- ja ikkunalistoitustyöt

Valmistuneet työvaiheet:

-

Piha-alue

Meneillään olevat työvaiheet:

- Ylimääräisten tavaroiden poisvienti

Seuraavan viikon tulevat työvaiheet:


-

Valmistuneet työvaiheet:

-

Muuta

- Koko rakennuksessa käynnissä olevat työvaiheet (suluissa kokonaisvalmiusprosentti):
 - Lukitus- ja heloitusasennukset (75 %)
 - Varusteasennukset (95 %)
 - Kaluste- ja laiteasennukset (~80 %)
 - Välioviasennukset (90 %)
 - Kenttä- ja keskuslaiteasennukset (60 %)
 - Kaideasennukset (39 %)
 - Toimintakoesiivoukset (~20 %)
 - Tasoite- ja maalauksen korjauskierrokset aloitettu (~20 %)
- Koulunmäenkadun muutoksia kevyelle liikenteelle tehty 15.11. Betoniattoja siirretty. Katu avataan muulle liikenteelle helmikuun 2025 aikana.

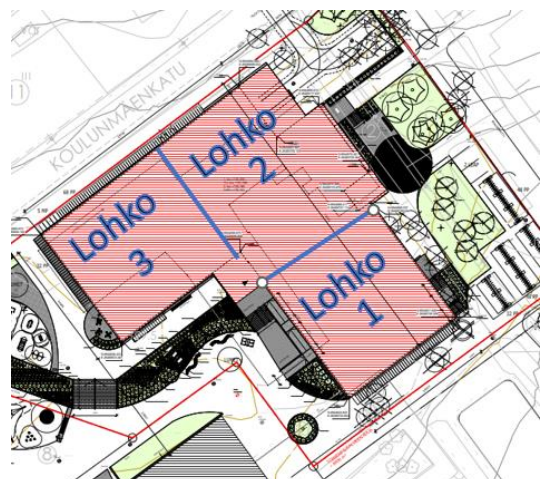

Lohko 2. 29.11.2024

Puisten istuinportaiden teko käynnissä. Lasikaideasennukset jatkuvat ensi viikolla.




Lohko 1. 29.11.2024

Liikuntasali, rakennustyöt pääosin valmiina. Lattiarakenteiden asennukset alkavat ensi viikolla.



Lohko 2. 29.11.2024

Kerros 2, oppilaslokeroiden
asennus käynnissä.

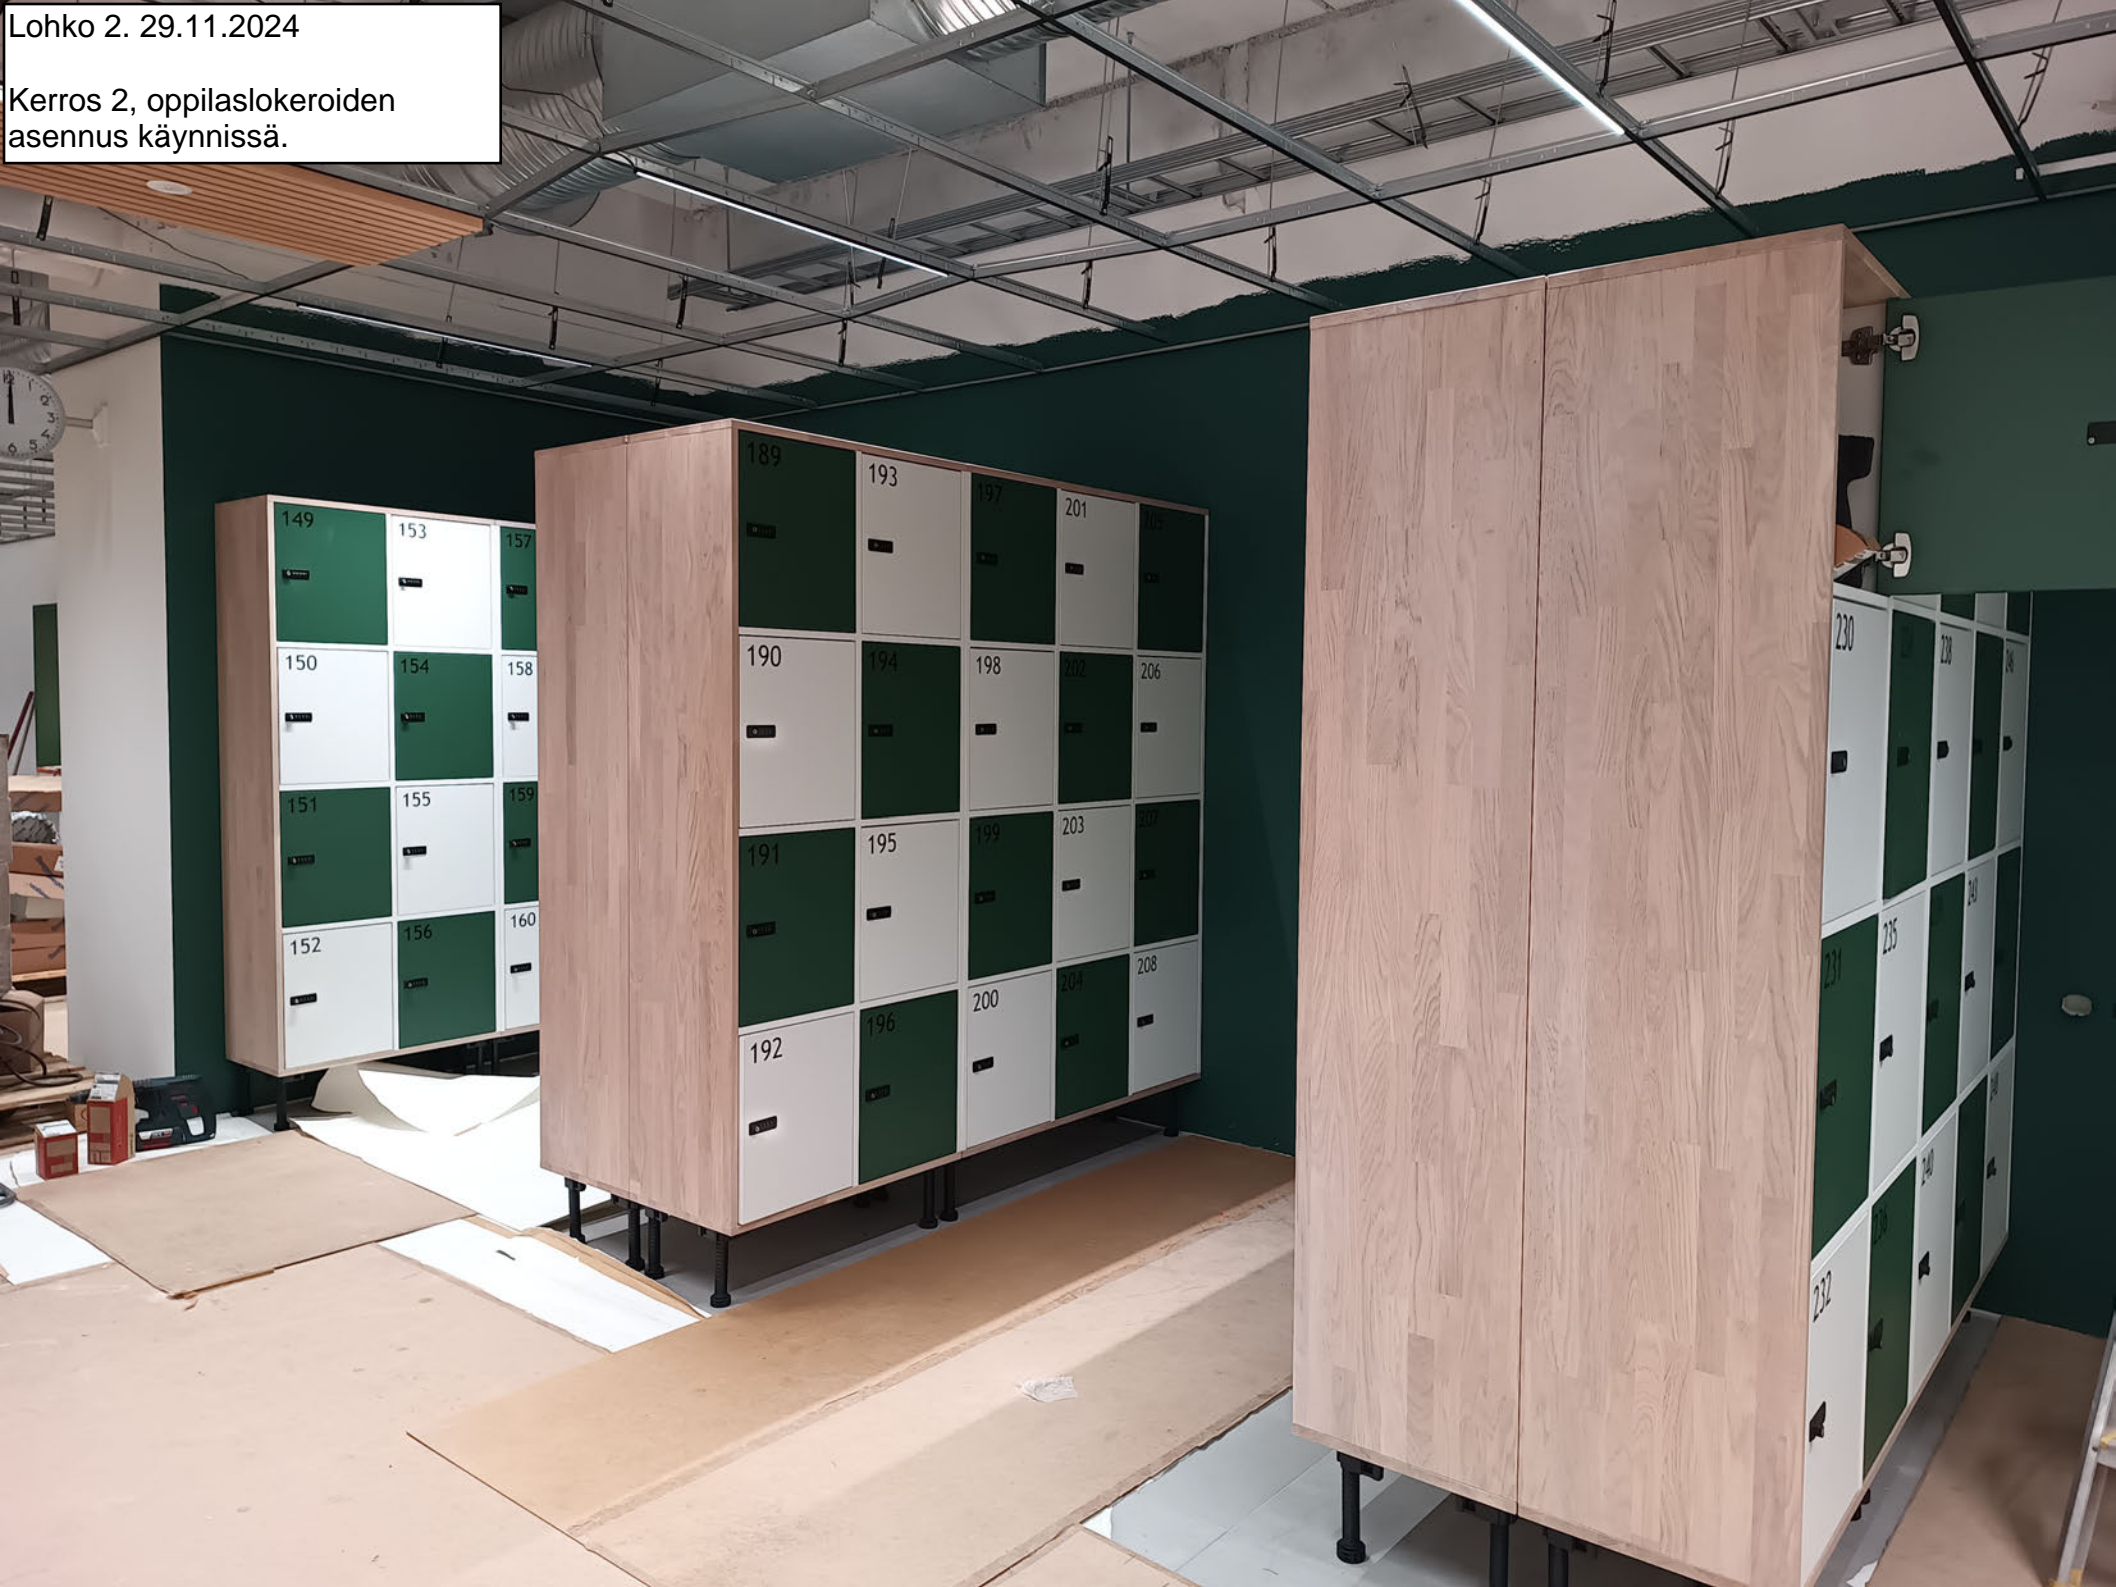

Lohko 1. 29.11.2024

Kerros 2, maalauksen korjauskierros suoritettu. Alue toimintakoevalmiudessa. Seuraavaksi alakattojen ummistus.

